


クリーンセンターふたばにおける 事業の進捗状況等について

令和7年10月

環境省福島地方環境事務所

施設の状況

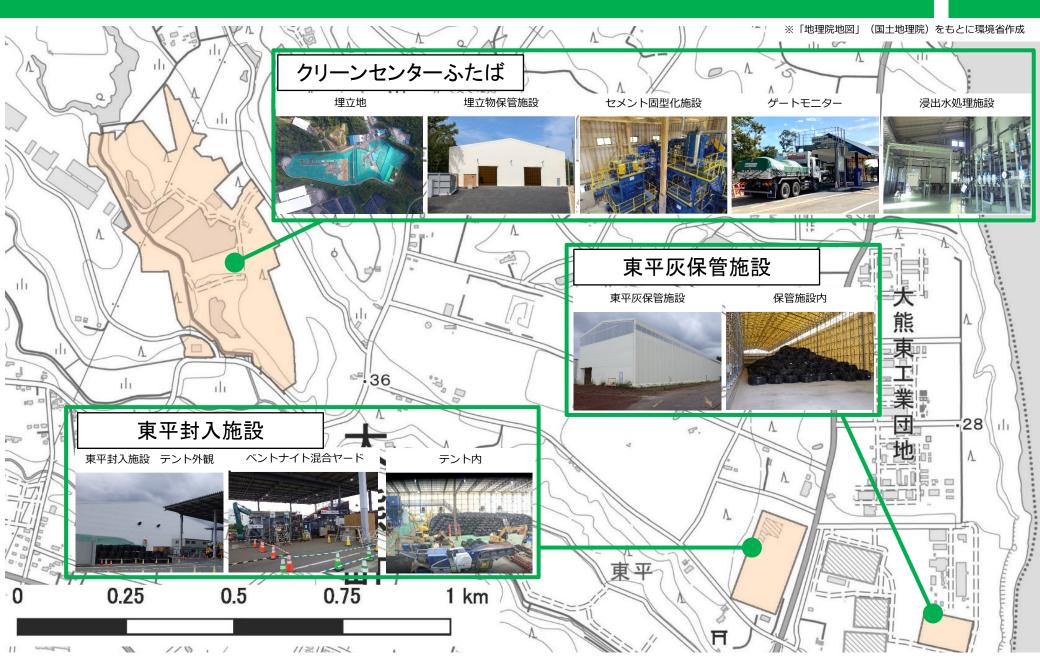


令和7年度の運搬状況

運搬実績(令和7年8月末時点)

| 区分 | 令和5年度計 | 令和6年度計 | 令和7年度 運搬量(トン) | | | | | 累計 | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| <u>ь</u> Л | (令和5年6月~ 令和6年3月) | (令和6年4月~ 令和7年3月) | 4月 | 5月 6月 7月 | | 7月 | 8月 | 年度計 |) | |
| 焼却灰 (主灰) | 12,011 | 11,376 | 40 | 316 | 956 | 1,448 | 1,032 | 3,792 | 27,179 | |
| 焼却灰 (飛灰) | 2,061 | 3,127 | 16 | 94 | 123 | 154 | 129 | 516 | 5,704 | |
| 不燃物 | 6,684 | 9,668 | 70 | 748 | 512 | 482 | 370 | 2,182 | 18,534 | |
| 合計 | 20,756 | 24,171 | 126 | 1,158 | 1,591 | 2,084 | 1,531 | 6,490 | 51,417 | |


[※]運搬量は仮置場等から中継地点への運搬も含むため、埋立量と一致しません。

運搬計画(令和7年8月末時点)

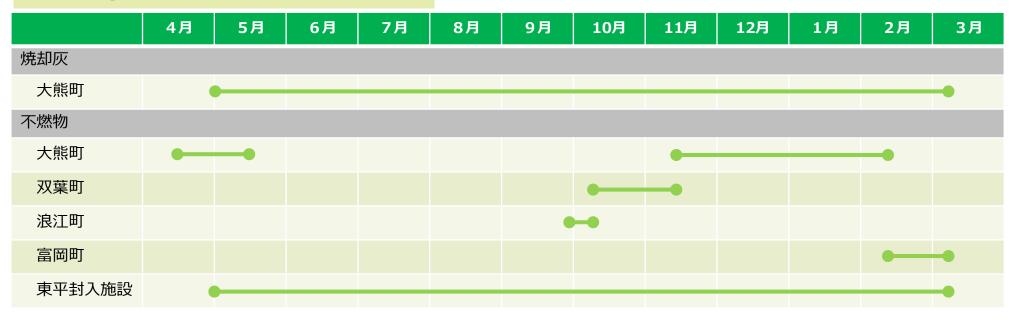

令和7年度の埋立処分状況





令和7年度の埋立処分実績

埋立処分実績(令和7年8月末時点)

| 区分 | | 令和5年度計 | 令和6年度計 | 令和7年度 埋立量(袋) | | | | | 累計 | |
|----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | (令和5年6月~ 令和6年3月) | (令和6年4月~ 令和7年3月) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 年度計 | जर । |
| 1期埋立▷ | 区画 | 670 | 1,779 | 18 | 97 | 133 | 148 | 128 | 524 | 2,973 |
| 2 W#+555 | 主灰 | 5,929 | 8,741 | 40 | 316 | 716 | 1,004 | 744 | 2,820 | 17,490 |
| 2期埋立区画 | 不燃物 | 575 | 4,007 | 28 | 236 | 332 | 364 | 284 | 1,244 | 5,826 |
| 合計 | | 7,174 | 14,527 | 86 | 649 | 1,181 | 1,516 | 1,156 | 4,588 | 26,289 |



2期埋立地の様子 (令和7年3月埋立地搬入路入口付近から撮影)



1 期埋立地の様子 (令和7年3月あずまや前より撮影)

埋立計画数量と埋立率(令和7年8月末時点)

埋立数量(単位:㎡)

| 区分 | 埋立可能 容量 | 計画数量(㎡) (計画累計(㎡)) | | | 実績数量(㎡) (実績累計(㎡)) | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | (m) | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 双葉郡内の生活ごみ及び インフラ整備等の廃棄物 | 100,000 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 特定廃棄物 | 180,000 | 26,830 | 14,860 <i>(41,690)</i> | 16,350 (58,050) | 31,096 | 23,992 (55,088) | 5,060 (60,148) | |
| 合計 | 280,000 | 26,830 | 14,860 <i>(41,690)</i> | 16,350 (58,050) | 31,096 | 23,992 (55,088) | 5,060 (60,148) | |

※各数量には土壌層の量が含まれます。 ※四捨五入のため合計が合わない場合があります。

※令和5年度実績数量:令和6年2月1日時点の測量結果+2~3月の埋立袋数の換算値

令和6年度実績数量:令和7年1月31日時点の測量結果+2~3月の埋立袋数の換算値 ※令和7年度実績数量:埋立袋数の換算値

埋立率(単位:%)

| 区分 | 埋立可能 容量 | 計画埋立率(%) (計画累計/容量) | | | 埋立率(%) (実績累計/容量) | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|--|
| | (㎡) | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 双葉郡内の生活ごみ及び インフラ整備等の廃棄物 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定廃棄物 | 180,000 | 14.9 | 23.2 | 32.3 | 17.3 | 30.6 | 33.4 | |
| 合計 | 280,000 | 9.6 | 14.9 | 20.7 | 11.1 | 19.7 | 21.5 | |

[※]埋立率は、埋立可能容量に対する累計の埋立数量の割合を示します。

作業員の被ばく線量管理(1/3)

(1) 測定方法

● クリーンセンターふたば及び各積込場所での作業者は、ガラスバッジ線量計と電子ポケット線量計の2種類の線量計を併用して測定・記録しています。

▶ガラスバッジ線量計:1か月毎の線量を測定し、累積被ばく量を放射線管理手帳に記録

→放射線従事者中央登録センターへ登録

▶電子ポケット線量計:1日毎の線量を測定し、当月の被ばく量を把握

輸送車両の運転手は、ガラスバッジ線量計で測定・記録しています。

被ばく線量の測定方法

| 作業区分 | 被ばく線量の測定方法 |
|----------------------|--|
| 埋立処分場内作業者 (処分場) | ガラスバッジ線量計を携行し、1か月毎の被ばく線量を 測定→放管手帳に記録し、中央登録センターへ登録 |
| | 電子ポケット線量計を携行し1日毎の被ばく線量を把握 |
| 埋立処分場外作業者 (各積込場所) | ガラスバッジ線量計を携行し、1か月毎の被ばく線量を 測定→放管手帳に記録し、中央登録センターへ登録 |
| | 電子ポケット線量計を携行し1日毎の被ばく線量を把握 |
| 輸送車両の運転手 | ガラスバッジ線量計を携行し、1か月毎の被ばく線量を 測定→放管手帳に記録し、中央登録センターへ登録 |



ガラスバッジ




電子ポケット線量計

作業員の被ばく線量管理(2/3)

(2) 測定結果

① **埋立処分場内作業(処分場)、積込作業等(処分場以外)** (ガラスバッジ線量計による測定結果)

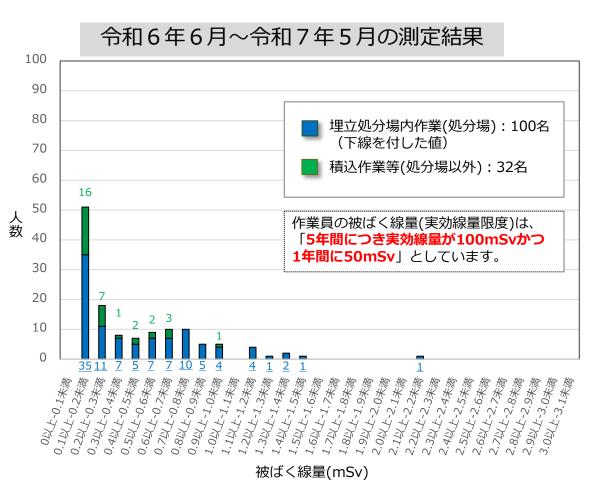

令和5年6月~令和7年8月の測定結果

| 被ばく線量 | 令和 5 ⁴ ~令和 6 | | 令和 6 ~令和 7 | | 令和 7 ~令和 7 | |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------|----|---------------|---|
| (mSv) | 埋立処分 場内作業 | 積込 作業等 | 埋立処分 場内作業 | | 埋立処分 場内作業 | — |
| 3.0以上-3.1未満 | | 1 | | | | |
| 2.9以上-3.0未満 | | | | | | |
| 2.8以上-2.9未満 | | 1 | | | | |
| 2.7以上-2.8未満 | | 1 | | | | |
| 2.6以上-2.7未満 | | | | | | |
| 2.5以上-2.6未満 | | | | | | |
| 2.4以上-2.5未満 | | | | | | |
| 2.3以上-2.4未満 | 1 | | | | | |
| 2.2以上-2.3未満 | | | | | | |
| 2.1以上-2.2未満 | | | 1 | | | |
| 2.0以上-2.1未満 | | | | | | |
| 1.9以上-2.0未満 | | | | | | |
| 1.8以上-1.9未満 | 1 | 1 | | | | |
| 1.7以上-1.8未満 | 1 | 1 1 | | | | |
| 1.6以上-1.7未満 | 3 | | | | | |
| 1.5以上-1.6未満 | 3 | | | | | |
| 1.4以上-1.5未満 | | | 1 | | | |
| 1.3以上-1.4未満 | 3 | 2 | 2 | | | |
| 1.2以上-1.3未満 | 2 | 2 2 | 1 | | | |
| 1.1以上-1.2未満 | 6 | 4 | 4 | | | |
| 1.0以上-1.1未満 | 3 | 1 | | | | |
| 0.9以上-1.0未満 | 5 | | 4 | 1 | | |
| 0.8以上-0.9未満 | 7 | 2 | 5 | | | |
| 0.7以上-0.8未満 | 5 | 4 | 10 | | | |
| 0.6以上-0.7未満 | 7 | 6 | 7 | 3 | | |
| 0.5以上-0.6未満 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 0.4以上-0.5未満 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 0.3以上-0.4未満 | 12 | 9 | 7 | 1 | 19 | 1 |
| 0.2以上-0.3未満 | 17 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 |
| 0.1以上-0.2未満 | 36 | 10 | 35 | 16 | 11 | 7 |
| -0.1未満 | | | | | | |

※ 埋立開始時期を起点として集計。

表中単位:人


作業員の被ばく線量管理(3/3)

(2) 測定結果

②運転者

(ガラスバッジ線量計による測定結果)

令和6年6月~令和7年5月の測定結果

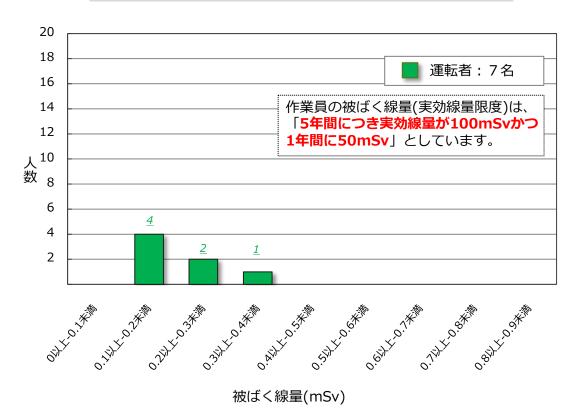

令和5年6月~令和7年8月の測定結果

| 被ばく線量 | 令和5年6月 ~令和6年5月 | 令和6年6月 ~令和7年5月 | 令和7年6月 ~令和7年8月 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (mSv) | 運転者 | 運転者 | 運転者 |
| 2.6以上-2.7未満 | | | |
| 2.5以上-2.6未満 | | | |
| 2.4以上-2.5未満 | | | |
| 2.3以上-2.4未満 | | | |
| 2.2以上-2.3未満 | | | |
| 2.1以上-2.2未満 | | | |
| 2.0以上-2.1未満 | | | |
| 1.9以上-2.0未満 | | | |
| 1.8以上-1.9未満 | | | |
| 1.7以上-1.8未満 | | | |
| 1.6以上-1.7未満 | | | |
| 1.5以上-1.6未満 | | | |
| 1.4以上-1.5未満 | | | |
| 1.3以上-1.4未満 | | | |
| 1.2以上-1.3未満 | | | |
| 1.1以上-1.2未満 | | | |
| 1.0以上-1.1未満 | | | |
| 0.9以上-1.0未満 | | | |
| 0.8以上-0.9未満 | | | |
| 0.7以上-0.8未満 | | | |
| 0.6以上-0.7未満 | | | |
| 0.5以上-0.6未満 | 1 | | |
| 0.4以上-0.5未満 | 3 | | |
| 0.3以上-0.4未満 | 4 | 1 | 1 |
| 0.2以上-0.3未満 | 4 | 2 | 2 |
| 0.1以上-0.2未満 | 5 | 4 | 1 |
| 0以上-0.1未満 | | | |
| ※ 埋立開始 | 時期を起点として | | 中単位:人 |

放射能連続測定装置の入替え

- 第5回委員会(令和6年10月)で示した装置の入替方針に基づき対応を進めています。
- ◎浸出水処理施設連続測定装置:シンチレーション方式の装置に入れ替えて連続測定
- ◎地下水連続測定装置:連続測定装置は導入せず、ゲルマニウム半導体検出器での測定及び電気伝導率の連続測定により対応
- ◎釜場排水連続測定装置:連続測定装置は導入せず、降雨時のゲルマニウム半導体検出器での測定及 び電気伝導率の連続測定により対応



放射能連続測定装置の入替え(浸出水処理施設)

- 第5回委員会(令和6年10月)で示した以下の再発防止策を踏まえ、有識者の助言も得ながら、装置の選定を進めているところです。
- 今後、装置の製造を経て、今年度中の入替えを予定しています。

(第5回クリーンセンターふたば環境安全委員会資料(令和6年10月) 一部修正)

【再発防止策の概要】


- 対象とする測定装置 放射性物質の連続測定を行う水モニタ
- 対策を講ずるタイミング
 - ①測定装置の選定時
 - ②点検・校正時(出荷及び設置時(初期校正)並びに定期点検・校正時)
- 発注段階での要件設定

測定装置の導入に際して、**求める仕様や性能水準を環境省の発注書類において規定**する。 (規定する項目の例)対象核種、測定方式、検出下限値、検出器の性能(エネルギー分解能)

- チェック機能の強化
- ・発注者(環境省)、受注者の双方において、**有識者を含めた文書確認体制を構築**する。
- ・受注者において、**専門的知見を有する者が文書確認を適切に実施できる体制を確保**する。
- ・受注者による文書確認に際しては、内容の妥当性に加えて、**数値や記述内容、捺印等に不整合や不自然な点がないかを確認**する

スクリュー挟まれ事故と事故後の安全対策について(1/3)

- 東平封入施設の埋立資材の製作ヤードにおいて、設備の修繕作業の準備中に、作業員 がスクリューに右手を挟まれる事故が3月に発生しました。
- 植頭委員からご助言をいただきながら原因究明を行い、ハード面の安全対策や受注者による作業手順の見直し、監督員によるプレ作業確認などの再発防止を講じ5月に作業を再開しました。



事故発生現場位置関係図



埋立資材製作設備全景



事故発生状況 (再現)



事故発生点検口

- <発生日時> 令和7年3月12日(水)11時45分頃
- <発生場所>クリーンセンターふたば埋立資材製作ヤード(東平封入施設敷地内)
- 〈事故内容〉埋立資材の製作作業に従事する作業員が、材料となる溶融スラグを供給する スクリューの修繕作業の準備のため、スクリュー内の溶融スラグを排出する 目的で点検口に右手を入れ、右手指が挟まれたもの
- <被 災 者> 59歳男性(経験年数30年、当現場経験10か月)
- <被災状況>右手挫滅創 退院後にリハビリ通院を継続、今後、形成手術を予定(約1年)

スクリュー挟まれ事故と事故後の安全対策について(2/3)

◎ 2件の事故を踏まえた主な再発防止策

○八一ド面に関する対策

- ●メンテナンスが容易かつ頻度を抑えられる機械へ の転換(スクリューコンベヤ→ベルトコンベヤ)
- ●回転体(コンベヤ等)の防護カバーへの施錠や安全装置(インターロック)、回転灯の設置
- ●カメラ及び確認用モニターの追加設置





インターロック

確認用モニター

|作業手順書に関する対策

- ●清掃作業、点検作業、メンテナンス作業を手順書上で明確に区別 して認識を共有
- ●メンテナンスに係る作業の実施基準・頻度の見直し
- ●予定外作業発生時の承認フローの体制強化・周知・再教育
- ●職長に対する教育(職長・安全衛生責任者教育)を繰り返し実施

●監督体制に関する対策


- ●元請事業者における労働安全に関する専任職員の配置
- ●環境省監督職員、元請職員による巡視頻度の増加
- ●予定外作業発生時の環境省職員まで含めた作業手順確認体制構築



KY(危険予知)活動 による手順書の確認

スクリュー挟まれ事故と事故後の安全対策について(3/3)

◎対策後の設備状況

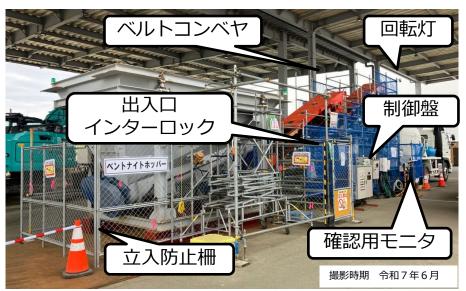




◎対策後の運用状況

作業手順書に関する教育のなかで、作業内容をより明確に区別することで、作業員が各作業を具体的にイメージでき、より安全な作業をめざす意識が高まっています。 各作業員から出た改善提案は、現場代理人の承認後に実際に作業手順に反映し、手順書を変更しています。

環境省職員も引き続き巡視の強化、作業手順の確認を実施し、対策の効果及び定着を確認してまいります。

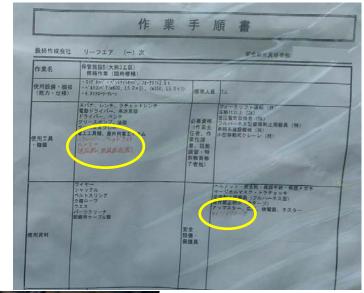




←手順書の変更の必要性を見つけ 報告をした作業員のヘルメット に☆シールを貼る表彰制度。

不燃物の破砕封入場所の変更について

- 昨年クリーンセンターふたば建屋内において発生した事故対策の一環として、当該建屋内で実施する作業はセメント固型化作業のみとし、不燃物の破砕封入作業を東平封入施設のテント内で実施することで、それぞれの作業スペースの確保に取り組むこととしました。
- 東平封入施設テント内への破砕処理用機材の設置、テント内に定置中であった不燃物の破砕封入を完了し、10月から不燃物の破砕封入作業を東平封入施設に完全移行しました。

■東平封入施設の施設活用状況










嵩上げの実施方針(1/2)

- 新たに特定帰還居住区域復興再生計画が策定されたことに伴い、クリーンセンターふたばにおける特定廃棄物の埋立量が、実施協定書に定める埋立容量である18万m³を超過する可能性があることから、必要容量を確保するため、安全性・安定性の観点も踏まえながら嵩上げを検討しています。
- 今後、嵩上げについての地元との調整、技術的な課題への対処等を進めてまいります。




嵩上げのイメージ図



嵩上げ時の断面イメージ図

嵩上げの実施方針(2/2)

- 特定廃棄物の埋立容量(18万㎡)を超過する見込みの2029年度までに地元との調整を完了し、法令上の手続を実施したいと考えております。
- 地元の了解を得たのちに、全体容量(28万㎡)を超過する最短の見込みである2035 年度以降、実際の嵩上げを実施していきます。

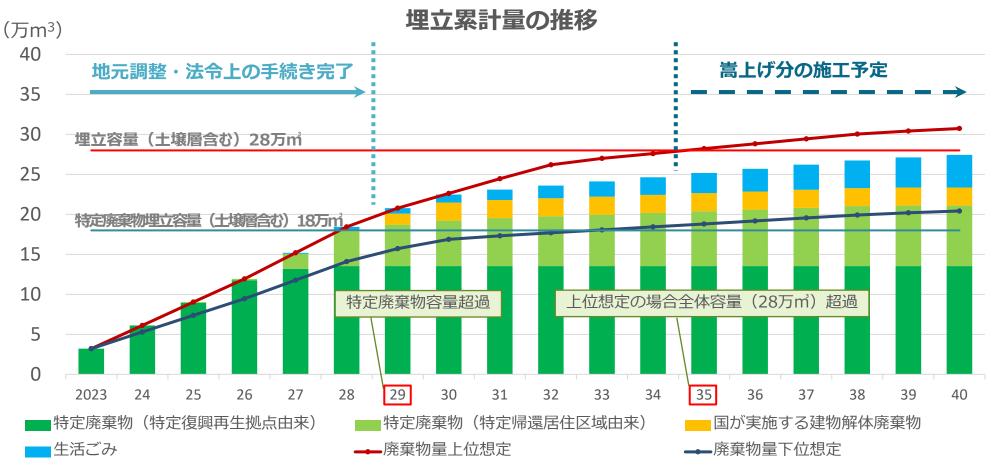

※廃棄物埋立量の中位想定を棒グラフで表記

法面部における間隙の有効活用

- クリーンセンターふたばでは、廃棄物は1m立方のフレキシブルコンテナを用いて埋め立てています。このため、高さや幅が1mに満たない法面部の間隙では廃棄物の埋立てが行えず、間詰材等を埋め立てることで埋立可能容量を圧迫しています。
- このような法面部間隙を有効活用するため、1 m立方とは形状の異なるフレキシブルコンテナ(平型フレコン)等で廃棄物を埋め立てることで、埋立可能容量を確保することを検討しています。
- 有識者のご意見を踏まえながら、技術的な課題について検討を進めてまいります。

