

セメント固型化処理施設及び第二保管施設の建設工事期間中の 環境監視結果（平成30年8月）

1. 当該月の工事概要

8月度は、北搬出入路は上部構造物の設置を終え舗装工事、固型化処理施設は基礎工事を終え、建物の建設や設備の設置工事を行っているところで、第二保管施設は、先月に引き続き建物のテント上屋の設置を行っています。

2. 環境モニタリング実施項目

(1) 測定日と測定日当日の作業内容

表-1 測定日の作業内容

測定日		北搬出入路	固型化処理施設	第二保管施設
8月度	H30.8.1～ H30.8.2	仮設ガードレール 設置	固型化処理棟 土間鉄筋配筋、受入時保管ピット基礎コンクリート打設、鉄骨建方、屋根葺 保管棟1 コンクリート均し 管理棟1 鉄骨建方、配管 管理棟2 土間スラブコンクリート打設、空調配管、	保管棟2 基礎コンクリート打設、テント材量組立、鉄骨建方 保管棟3 テント材料組立、鉄骨建方 管理棟3 捨てコンクリート打設

(2) 測定項目と測定地点

表-2 環境モニタリング項目（建設工事中）

対象	測定項目	測定頻度	測定地点		測定点数
			固型化処理施設	第二保管施設	
粉じん	総粉じん量	1回/月	風下1箇所	風下1箇所	2
	粉じん中の放射性セシウム	1回/月	風下1箇所	風下1箇所	2
	粉じん中のダイオキシン類	1回/月	風下1箇所	風下1箇所	2
地下水	地下水位	連続	観測井戸 2箇所	観測井戸 2箇所	4

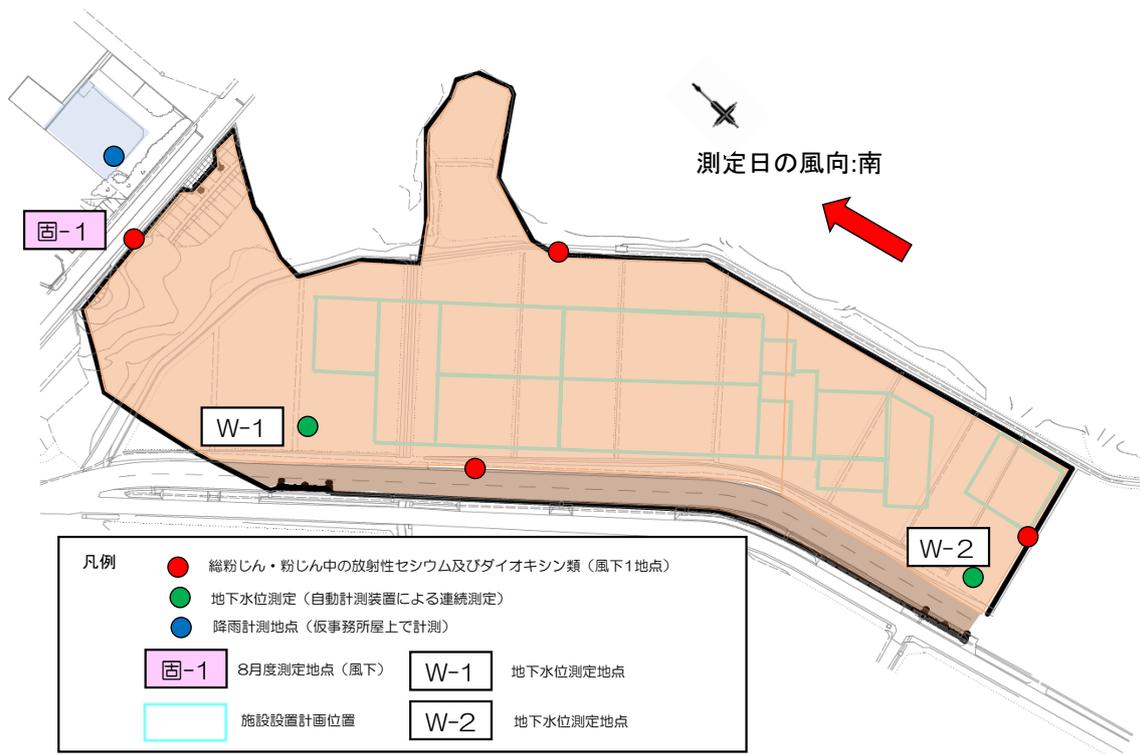


図-1 固型化処理施設における測定地点

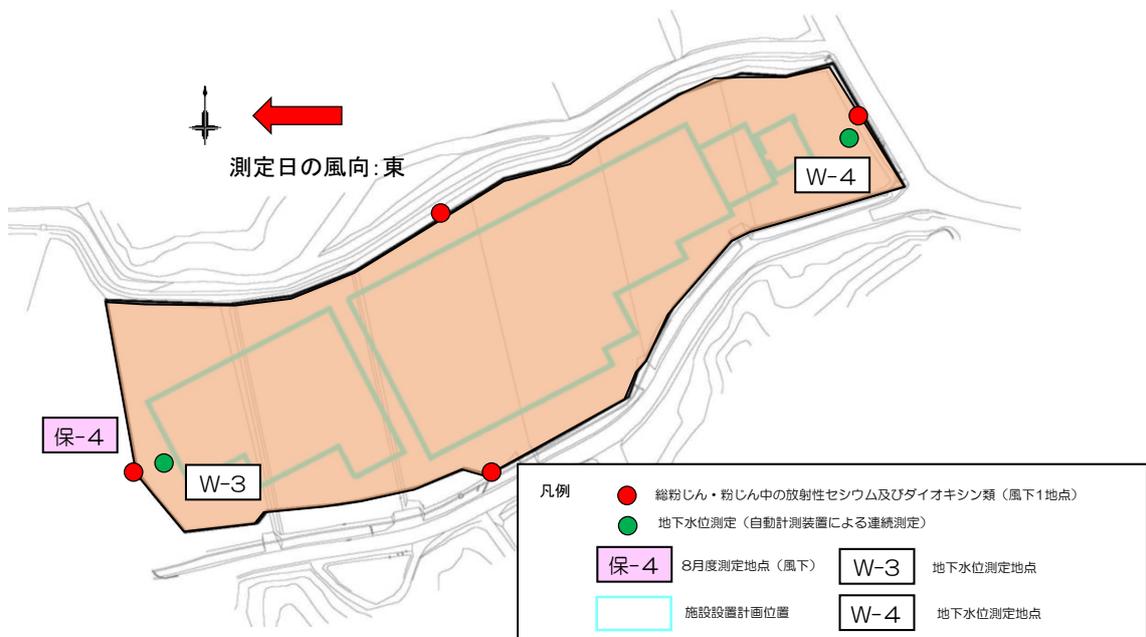


図-2 第二保管施設における測定地点

3. 調査結果

表-3 固型化処理施設における分析結果

対象	騒音					振動					粉じん										備考														
測定項目	等価騒音レベル L_{Aeq} (dB(A))					等価振動レベル (dB(Z))					総粉じん (mg/m ³)					粉じん中の放射性セシウム ^{※3} (Bq/m ³)						粉じん中のダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)													
測定頻度	1回/3ヶ月					1回/3ヶ月					1回/月					1回/月						1回/月													
測定地点	敷地境界4カ所					敷地境界4カ所					風下1カ所					風下1カ所						風下1カ所													
	測定日 (天気)	固-1	固-2	固-3	固-4	測定日 (天気)	固-1	固-2	固-3	固-4	測定日 (天気)	固-1	固-2	固-3	固-4	測定日 (天気)	固-1	固-2	固-3	固-4	検出 下限値	測定日 (天気)	固-1	固-2	固-3	固-4									
目標 (環境基準値)	-					-					0.1 ^{※1}					-					上段 ¹³⁴ Cs; 20 ^{※2} 下段 ¹³⁷ Cs; 30 ^{※2}					-					0.6				
H30年	2月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 2月15日 (晴)	-	-	0.06	-	2018年 2月15日 (晴)	-	-	ND	-	0.0025	2018年 2月15日 (晴)	-	-	0.006	-								
	3月度	2018年 3月29日 (晴)	57.5	61.4	55.0	66.6	2018年 3月29日 (晴)	31.5	41.3	33.5	49.2	2018年 3月28日 (晴)	0.12	-	-	-	2018年 3月28日 (晴)	ND	-	-	0.0025	2018年 3月28日 (晴)	0.008	-	-	-									
	4月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 4月10日 (曇り)	0.08	-	-	-	2018年 4月10日 (曇り)	ND	-	-	0.0025	2018年 4月10日 (曇り)	0.0062	-	-	-									
	5月度	2018年 5月11日 (晴)	57.0	61.3	64.3	64.3	2018年 5月11日 (晴)	31.0	40.1	47.1	54.4	2018年 5月10日 (晴)	-	-	0.03	-	2018年 5月10日 (晴)	-	-	ND	0.0025	2018年 5月10日 (晴)	-	-	0.0060	-									
	6月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 6月5日 (晴)	0.06	-	-	-	2018年 6月5日 (晴)	ND	-	-	0.0025	2018年 6月5日 (晴)	0.015	-	-	-									
	7月度	2018年 7月5日 (曇)	63.8	60.9	66.5	75.9	2018年 7月5日 (曇)	<30	31.7	52.2	58.7	2018年 7月3日 (晴)	0.08	-	-	-	2018年 7月3日 (晴)	ND	-	-	0.0025	2018年 7月3日 (晴)	0.0065	-	-	-									
	8月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 8月1日 (晴)	0.01	-	-	-	2018年 8月1日 (晴)	ND	-	-	0.0025	2018年 8月1日 (晴)	0.0065	-	-	-									
	9月度																																		

※1 総粉じん量:浮遊粒子状物質に係る環境基準値 ※2 空気中の濃度限度を示す。併せて、¹³⁴Cs濃度/20+¹³⁷Cs濃度/30≦1を満たす。 ※3 上段¹³⁴Cs 下段¹³⁷Csを示す。
 風下の測定地点を示す。 ND:検出下限値未滿 - :測定せず

表-4 第二保管施設における分析結果

対象	騒音					振動					粉じん													備考																						
測定項目	等価騒音レベル L_{Aeq} (dB(A))					等価振動レベル(dB(Z))					総粉じん ^{※1} (mg/m^3)				粉じん中の放射性セシウム ^{※3} (Bq/m^3)					粉じん中のダイオキシン類($pg-TEQ/m^3$)																										
測定頻度	1回/3ヶ月					1回/3ヶ月					1回/月				1回/月					1回/月																										
測定地点	敷地境界4カ所					敷地境界4カ所					風下1カ所				風下1カ所					風下1カ所																										
	測定日 (天気)	保-1	保-2	保-3	保-4	測定日 (天気)	保-1	保-2	保-3	保-4	測定日 (天気)	保-1	保-2	保-3	保-4	測定日 (天気)	保-1	保-2	保-3	保-4	検出 下限値	測定日 (天気)	保-1	保-2	保-3	保-4																				
目標 (環境基準値)	-					85					-					75					-				0.1 ^{※1}				-					上段 ^{134}Cs : 20 ^{※2} 下段 ^{137}Cs : 30 ^{※2}					-				0.6			
H30年	2月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 2月15日 (晴)	-	0.04	-	-	2018年 2月15日 (晴)	-	ND	-	-	-	2018年 2月15日 (晴)	-	0.005	-	-	-																			
	3月度	2018年 3月29日 (晴)	51.4	67.0	56.5	53.2	2018年 3月29日 (晴)	39.8	51.1	31.6	35.9	2018年 3月28日 (晴)	-	-	-	0.09	2018年 3月28日 (晴)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 3月28日 (晴)	-	-	-	0.007																			
	4月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 4月10日 (曇り)	-	-	-	0.04	2018年 4月10日 (曇り)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 4月10日 (曇り)	-	-	-	0.0063																				
	5月度	2018年 5月11日 (晴)	66.3	58.9	68.0	57.6	2018年 5月11日 (晴)	58.2	39.5	37.1	35.8	2018年 5月10日 (晴)	-	-	-	0.02	2018年 5月10日 (晴)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 5月10日 (晴)	-	-	-	0.0060																			
	6月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 6月5日 (晴)	-	-	-	0.04	2018年 6月5日 (晴)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 6月5日 (晴)	-	-	-	0.0064																				
	7月度	2018年 7月5日 (曇)	66.2	62.0	52.1	64.0	2018年 7月5日 (曇)	50.5	58.6	33.1	42.2	2018年 7月3日 (晴)	-	-	-	0.10	2018年 7月3日 (晴)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 7月3日 (晴)	-	-	-	0.0064																			
	8月度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年 8月1日 (晴)	-	-	-	0.08	2018年 8月1日 (晴)	-	-	-	ND	0.0025	2018年 8月1日 (晴)	-	-	-	0.0066																				
	9月度																																													

※1 総粉じん量:浮遊粒子状物質に係る環境基準値 ※2 空気中の濃度限度を示す。併せて、 ^{134}Cs 濃度/ $20+^{137}Cs$ 濃度/ $30 \leq 1$ を満たす。 ※3 上段 ^{134}Cs 下段 ^{137}Cs を示す。 風下の測定地点を示す。 ND:検出下限値未満 - :測定せず

表-5 地下水位測定結果

単位 TP^{※3} (m)

施設	地下水位測定位置	観測井 ^{※1} スクリーン深度 (スクリーン長)	地下水位 ^{※2}	平成30年度											
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
固型化处理施設	W-1	上端 7.96 下端 5.46 (L=2.5m)	月間高水位	11.51	11.42										
			月間平均水位	11.34	11.27										
			月間低水位	11.24	11.11										
	W-2	上端 3.82 下端 1.32 (L=2.5m)	月間高水位	9.52	9.87										
			月間平均水位	9.33	9.65										
			月間低水位	9.19	9.47										
第二保管施設	W-3	上端 1.47 下端-0.53 (L=2.0m)	月間高水位	8.86	9.05										
			月間平均水位	8.64	8.89										
			月間低水位	7.97 ^{※4}	8.68										
	W-4	上端 0.53 下端-3.47 (L=4.0m)	月間高水位	7.03	7.09										
			月間平均水位	6.88	6.93										
			月間低水位	6.67	6.58										

※1) 詳細な観測井諸元は、建設工事着手前の環境調査結果のうち、地下水調査(現状地下水調査結果)を参照のこと。

※2) 地下水位は、10分毎に測定しており、月間高水位は該当月の測定値の最大値、月間低水位は該当月の測定値の最小値、月間平均水位は、該当月の測定値の算術平均値を示す。

※3) (東京湾平均海面) 全国の標高の基準となる海水面の高さで東京湾中等潮位とも呼ばれる。

※4) 井戸のメンテナンスを実施したため、その際の水位が月間低水位として記録されている。

地下水位と時間降雨量

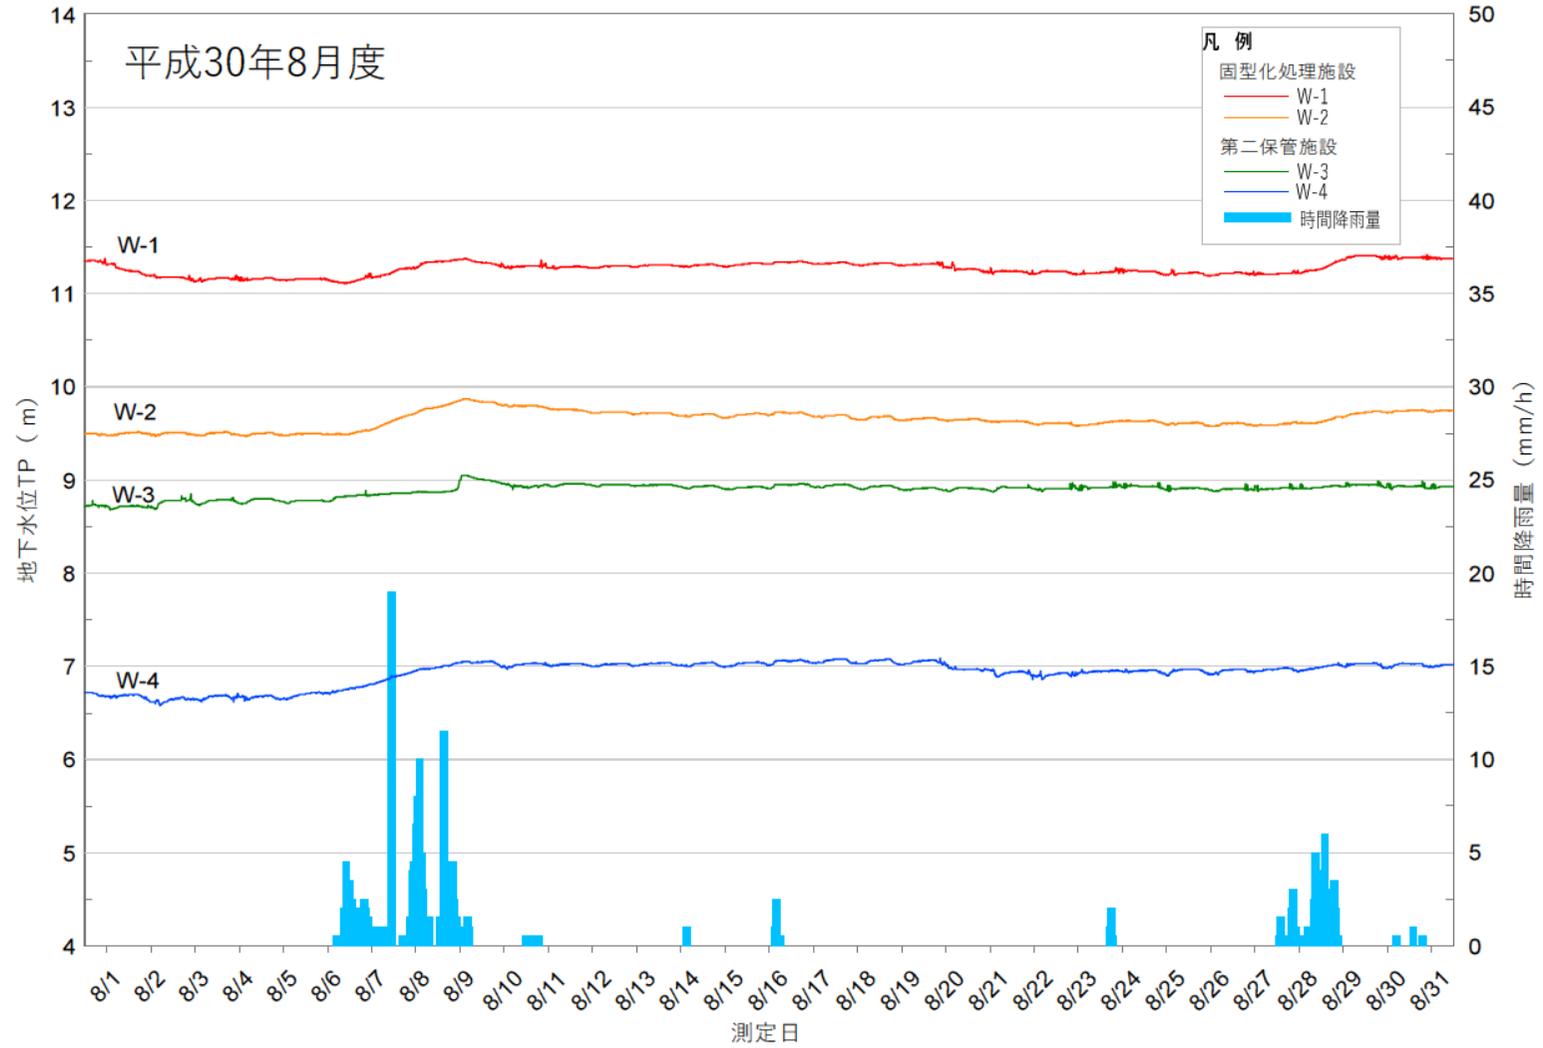


図-3 地下水位測定結果及び時間降雨量（平成30年8月度）

4. 施設配置計画図

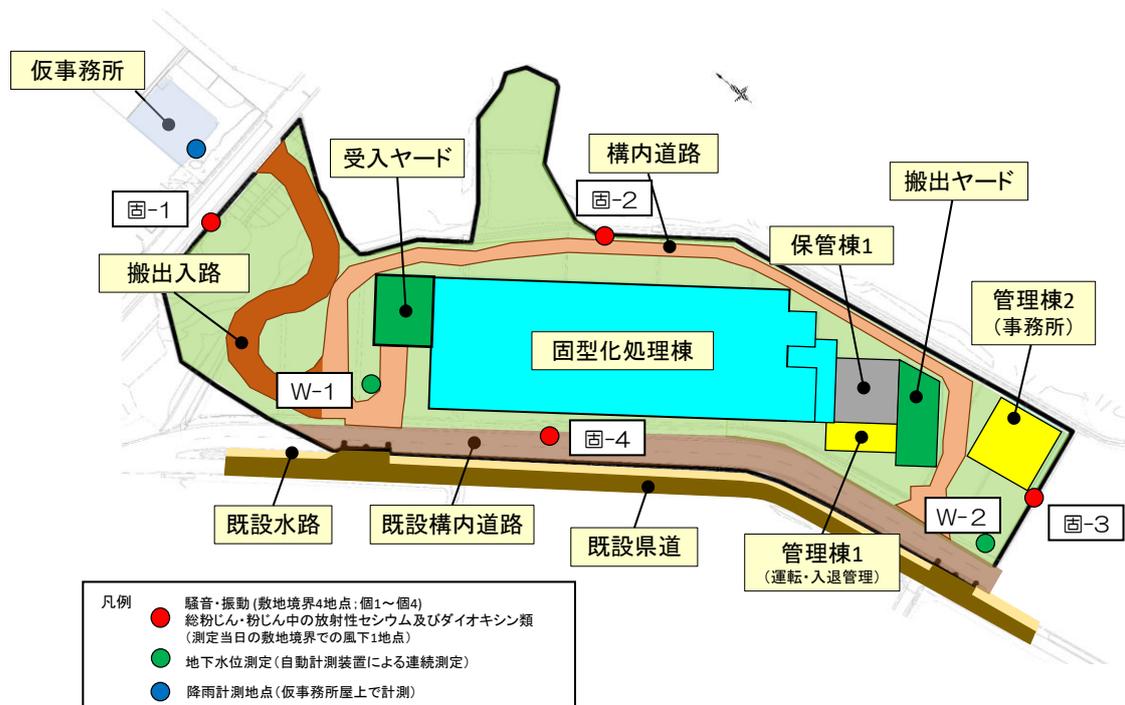


図-4 固型化処理施設における施設配置計画図



図-5 第二保管施設における施設配置計画図
