環境モニタリングの結果について

資料２－１

モニタリング計測箇所

- ★ 敷地境界の空間線量率（6地点）
  （☆ バックグラウンド1地点を含む）
- ★ 埋立地周囲の空間線量率（4地点）
- ★ 空間線量率（モニタリングポストによる測定）
- ■ 地下水水質（地下水集排水管）（1地点）
- ■ 浸出水原水水質（1地点）
- ■ 処理水水質（1地点）
- ■ 放流水水質（1地点）
- ● 悪臭（2地点）
- ● 埋立ガス（2地点）
- ● 河川水等の放射能濃度（8地点）
- ● 搬入経路における放射能濃度等（4地点）
- ● 騒音・振動（1地点）
- ◆ 大気中放射能濃度（4地点）
- ■ 雨水中放射能濃度（2地点）
- ● 植物（松葉）中の放射能濃度（3地点）
- ■ 地下水中放射能濃度（連続測定）
- ◆ 大気中放射能濃度（連続測定）

モニタリング調査実績

（H29年度のとりまとめは別添）

ア．敷地境界における空間線量率
（左図の ①～⑥ の地点）

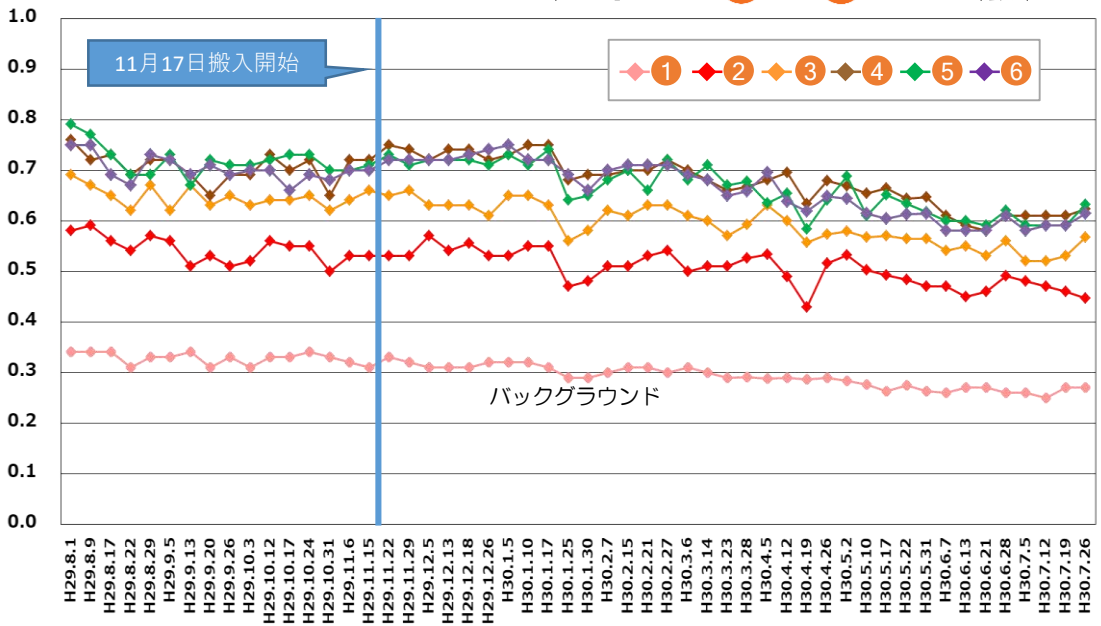

搬入に伴う空間線量率の有意な上昇は認められなかった

イ．施設下流域の河川水中の放射能濃度
（左図の ●の地点）

調査の結果、全て検出下限値※未満だった

※ 検出下限値１Ｂq/L以下

施設下流域の河川水中の放射能濃度測定はH29.7.16、H30.1.31の2回実施
