福島、
その先の環境へ。

資料１

クリーンセンターふたばにおける
事業の進捗状況等について

令和８年10月

環境省福島環境局

施設の状況

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

クリーンセンターふたば

埋立地



埋立物保管施設



セメント固型化施設



ゲートモニター



浸出水処理施設



東平封入施設

東平封入施設　テント外観



ベントナイト混合ヤード



テント内



東平保管施設


運搬状況（令和８年９月末時点）

運搬実績

区　分	令和５年度計（令和５年６月～）（トン）	令和６年度計（トン）	令和７年度計（トン）	令和８年度　運搬量（トン）												累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
焼却灰（主灰）	12,011	11,646	8,017	0	592	966	1,041	406	209							3,214	34,888
焼却灰（飛灰）	2,061	3,162	1,558	0	132	203	239	164	143							881	7,662
不燃物	6,684	8,311	6,408	0	413	698	813	568	550							3,042	24,445
合計	20,756	23,119	15,983	0	1,137	1,867	2,094	1,137	902							7,137	66,995

※小数点以下を四捨五入して表記しているため、合計が合わない場合があります。

運搬計画（令和８年度）

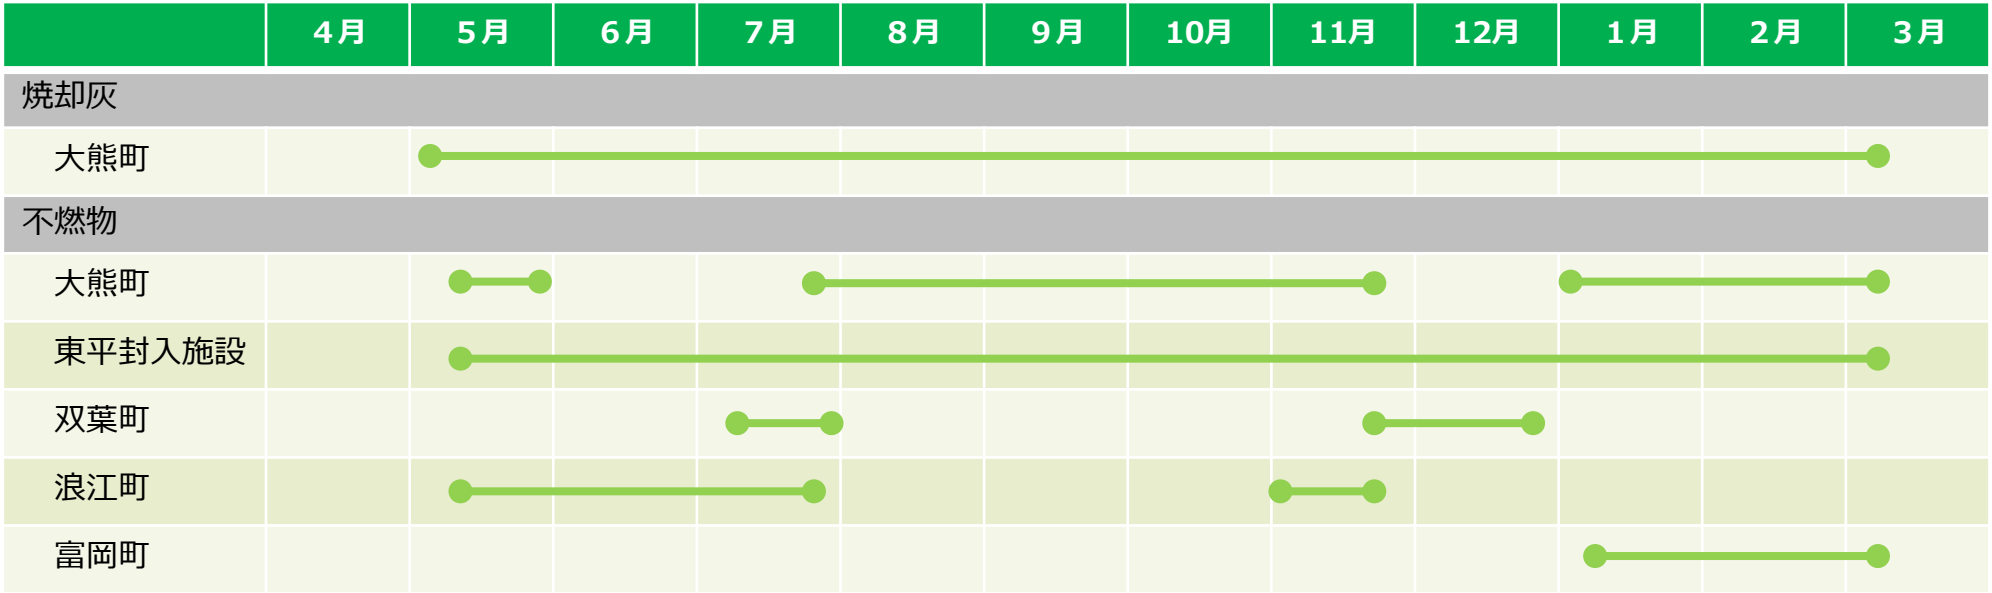


埋立処分実績（令和８年９月末時点）

埋立実績

区　分	令和５年度計（令和５年６月～）（袋）	令和6年度計（袋）	令和7年度計（袋）	令和８年度　埋立量（袋）												累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
1期埋立地	670	1,779	1,638	0	48	204	260	152	164							828	4,915
2期埋立地	6,504	12,748	12,750	0	656	1,320	1,472	804	572							4,824	36,826
合計	7,174	14,527	14,388	0	704	1,524	1,732	956	736							5,652	41,741

※1期埋立地：セメント固型化飛灰
　2期埋立地：主灰及び不燃物（石綿含有物等）を概ね7:3の割合で埋め立て

■クリーンセンターふたばの埋立状況（断面図）

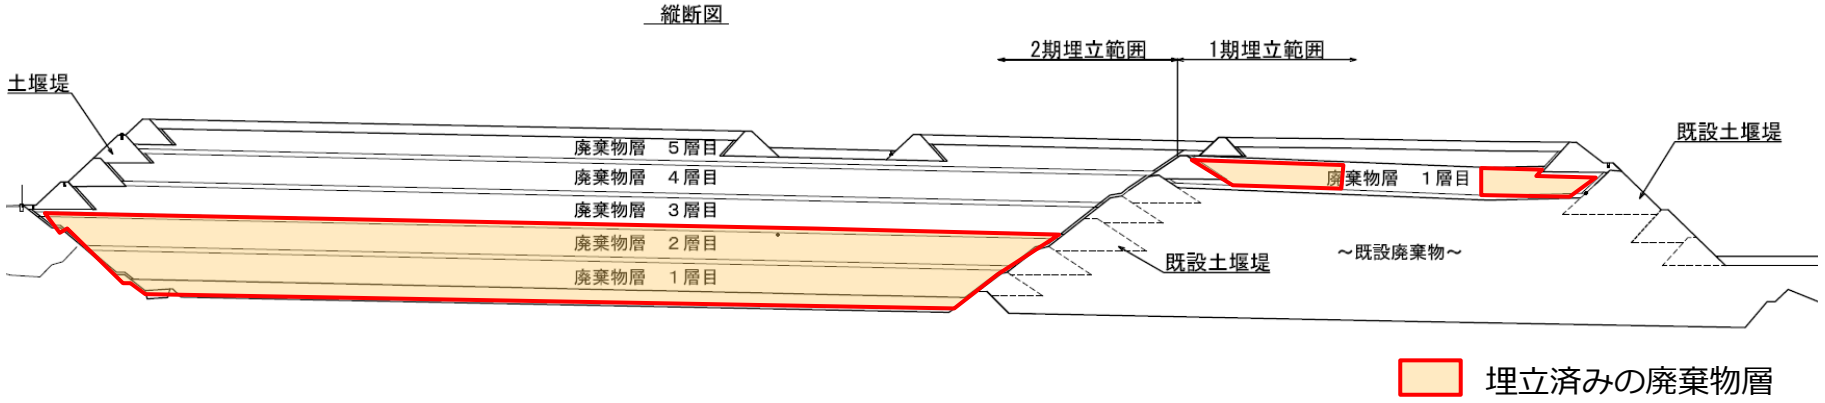

埋立計画数量と埋立率（令和８年９月末時点）

埋立数量

区　分	埋立可能容量（㎥）	計画数量（㎥）（計画累計（㎥））				実績数量（㎥）（実績累計（㎥））			
		令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
双葉郡内の生活ごみ及びインフラ整備等の廃棄物	100,000	0	0 *(0)*	0 *(0)*	0 *(0)*	0	0 *(0)*	0 *(0)*	0 *(0)*
特定廃棄物	180,000	26,830	14,860 *(41,690)*	*16,350* *(58,050)*	34,739 *(92,789)*	31,096	*23,992* *(55,088)*	*35,393* *(90,481)*	*6,443* *(96,924)*
合計	280,000	26,830	14,860 *(41,690)*	*16,350* *(58,050)*	34,739 *(92,789)*	31,096	*23,992* *(55,088)*	*35,393* *(90,481)*	*6,443* *(96,924)*

※各数量には土壌層の量が含まれます。　　※四捨五入のため合計が合わない場合があります。
※令和５～７年度実績数量：測量結果（一部埋立袋数の換算値を含む）
　令和８年度実績数量：９月末までの埋立袋数の換算値

埋立率

区　分	埋立可能容量（㎥）	計画埋立率（%）（計画累計/容量）				埋立率（%）（実績累計/容量）			
		令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
双葉郡内の生活ごみ及びインフラ整備等の廃棄物	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定廃棄物	180,000	14.9	23.2	32.3	51.5	17.3	30.6	50.3	53.8
合計	280,000	9.6	14.9	20.7	33.1	11.1	19.7	32.3	34.6


※埋立率は、埋立可能容量に対する累計の埋立数量の割合を示します。

作業員の被ばく線量管理


(1) 測定方法

- クリーンセンターふたばの作業者は、ガラスバッジ線量計を用いて１か月ごとの被ばく線量を測定・記録しています。

※ なお、１日の被ばく線量も電子ポケット線量計を携行し把握しています。



(2) 測定結果

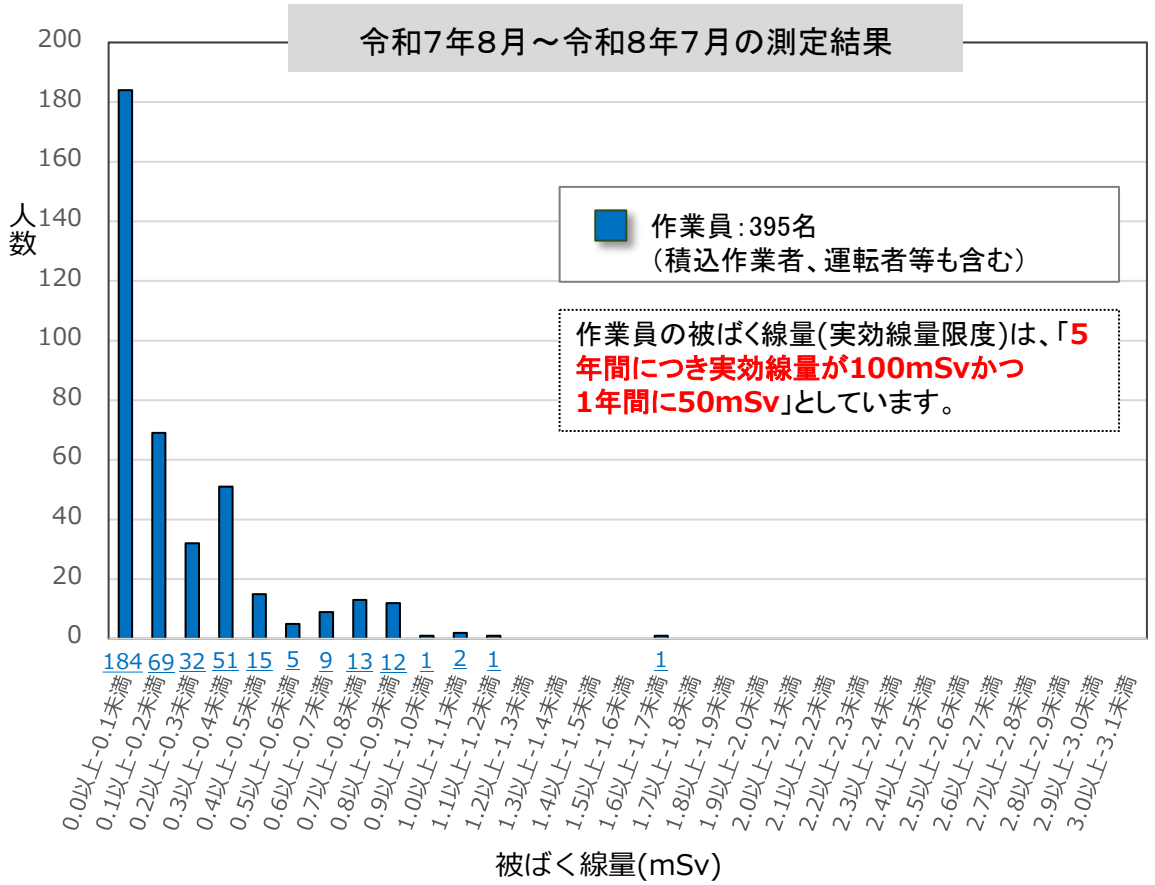

令和5年8月～令和8年7月の測定結果

被ばく線量（mSv）	令和５年８月～令和６年７月	令和６年８月～令和７年７月	令和７年８月～令和８年７月
3.0以上-3.1未満			
2.9以上-3.0未満			
2.8以上-2.9未満			
2.7以上-2.8未満			
2.6以上-2.7未満	1		
2.5以上-2.6未満	1		
2.4以上-2.5未満			
2.3以上-2.4未満	1		
2.2以上-2.3未満			
2.1以上-2.2未満	1		
2.0以上-2.1未満			
1.9以上-2.0未満			
1.8以上-1.9未満			
1.7以上-1.8未満			
1.6以上-1.7未満	3	1	1
1.5以上-1.6未満	1	1	
1.4以上-1.5未満	2	1	
1.3以上-1.4未満	8	2	
1.2以上-1.3未満	5	2	
1.1以上-1.2未満	9	1	1
1.0以上-1.1未満	6	6	2
0.9以上-1.0未満	6	2	1
0.8以上-0.9未満	8	7	12
0.7以上-0.8未満	15	4	13
0.6以上-0.7未満	19	13	9
0.5以上-0.6未満	11	13	5
0.4以上-0.5未満	16	9	15
0.3以上-0.4未満	25	20	51
0.2以上-0.3未満	28	12	32
0.1以上-0.2未満	100	28	69
0.0以上-0.1未満	102	91	184

表中単位：人


セメント固型化施設のオーバーホール実施について

- 安定的な施設運営の継続を目的に、機器設備等のオーバーホール（大規模改修）を２回に分けて実施しています。
- 初回は、大熊町仮設焼却施設のオーバーホールに合わせて10月７日～10月23日に行いました。
- 次回は、令和９年２月頃に予定しています。

■セメント固型化設備



■セメント固型化施設内図　※赤枠がオーバーホール実施エリア

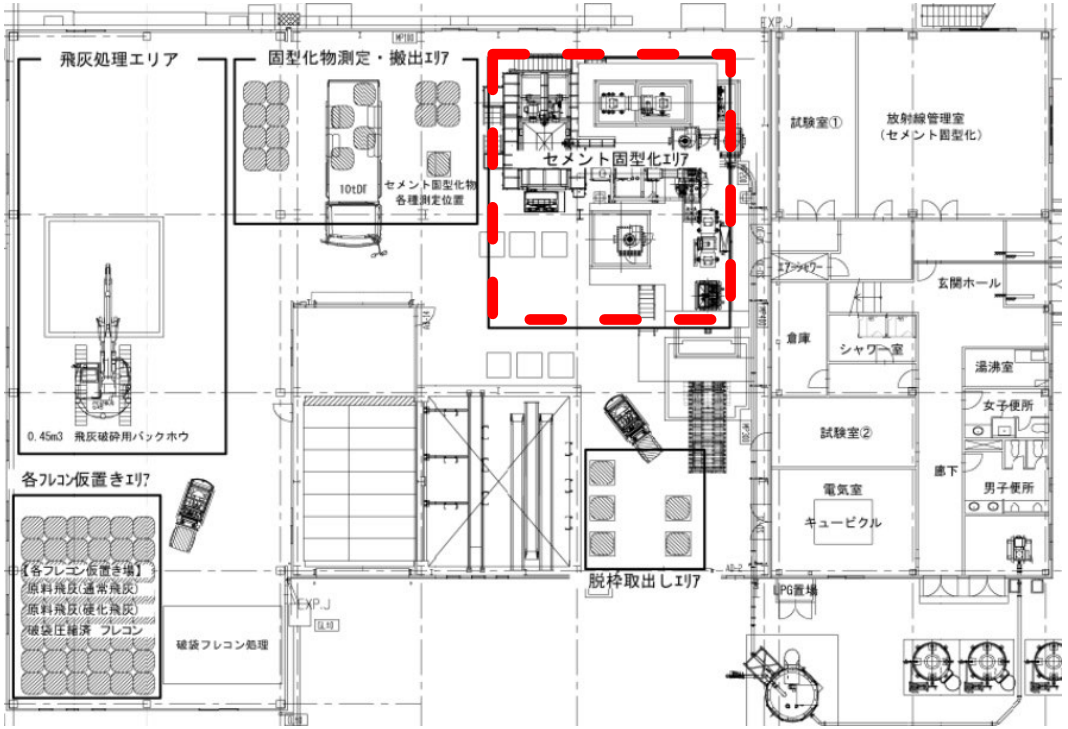

双葉郡の生活ごみの受入れについて

- 双葉郡の生活ごみについては、現在の特定廃棄物埋立処分施設（旧エコテック）における埋立処分を令和９年10月までとし、令和９年11月以降は、クリーンセンターふたばにおいて埋立処分することとしています。

【運搬計画】

○運搬先：クリーンセンターふたば（東平封入施設）
○頻度：10トン車で月５回程度
○経路：右図を参照

【運搬時の安全対策】

○運搬車両は、積載物の落下防止及び廃棄物の飛散・漏出防止等を徹底します。
○交通ルールを厳守し、一般車両優先を徹底します。

«荷姿»（イメージ）



«運搬ルート（案）»

